

Regione Lombardia
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità



CODICE
COMMESSA

LIVELLO
PROGETTAZIONE

D.P.R.
207/10

PROGRESSIVO
ELABORATO

CATEGORIA
OPERA

NUMERO
OPERA

REVISIONE

SCALA

R 2 2 A

D

b

0 0 6

I T

- -

R 1

LINEE MILANO-SEVESO-ASSO E SEVESO-CAMNAGO
POTENZIAMENTO NODO DI SEVESO
Progetto Definitivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
INTERVENTO COMPLESSIVO CON OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO

	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
Revisioni	3			
	2			
	1	NOV. 2020	MODIFICHE A SEGUITO RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA	
	0	OTT. 2020	PRIMA EMISSIONE	

NORD_ING

NORD_ING S.r.l.
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Antonella Volta

FERROVIENORD


FERROVIENORD S.p.A.
DIREZIONE SVILUPPO INFRASTRUTTURA
IL DIRETTORE
Ing. Marco Mariani

Progettista



Collaborazione

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE		AGG.	

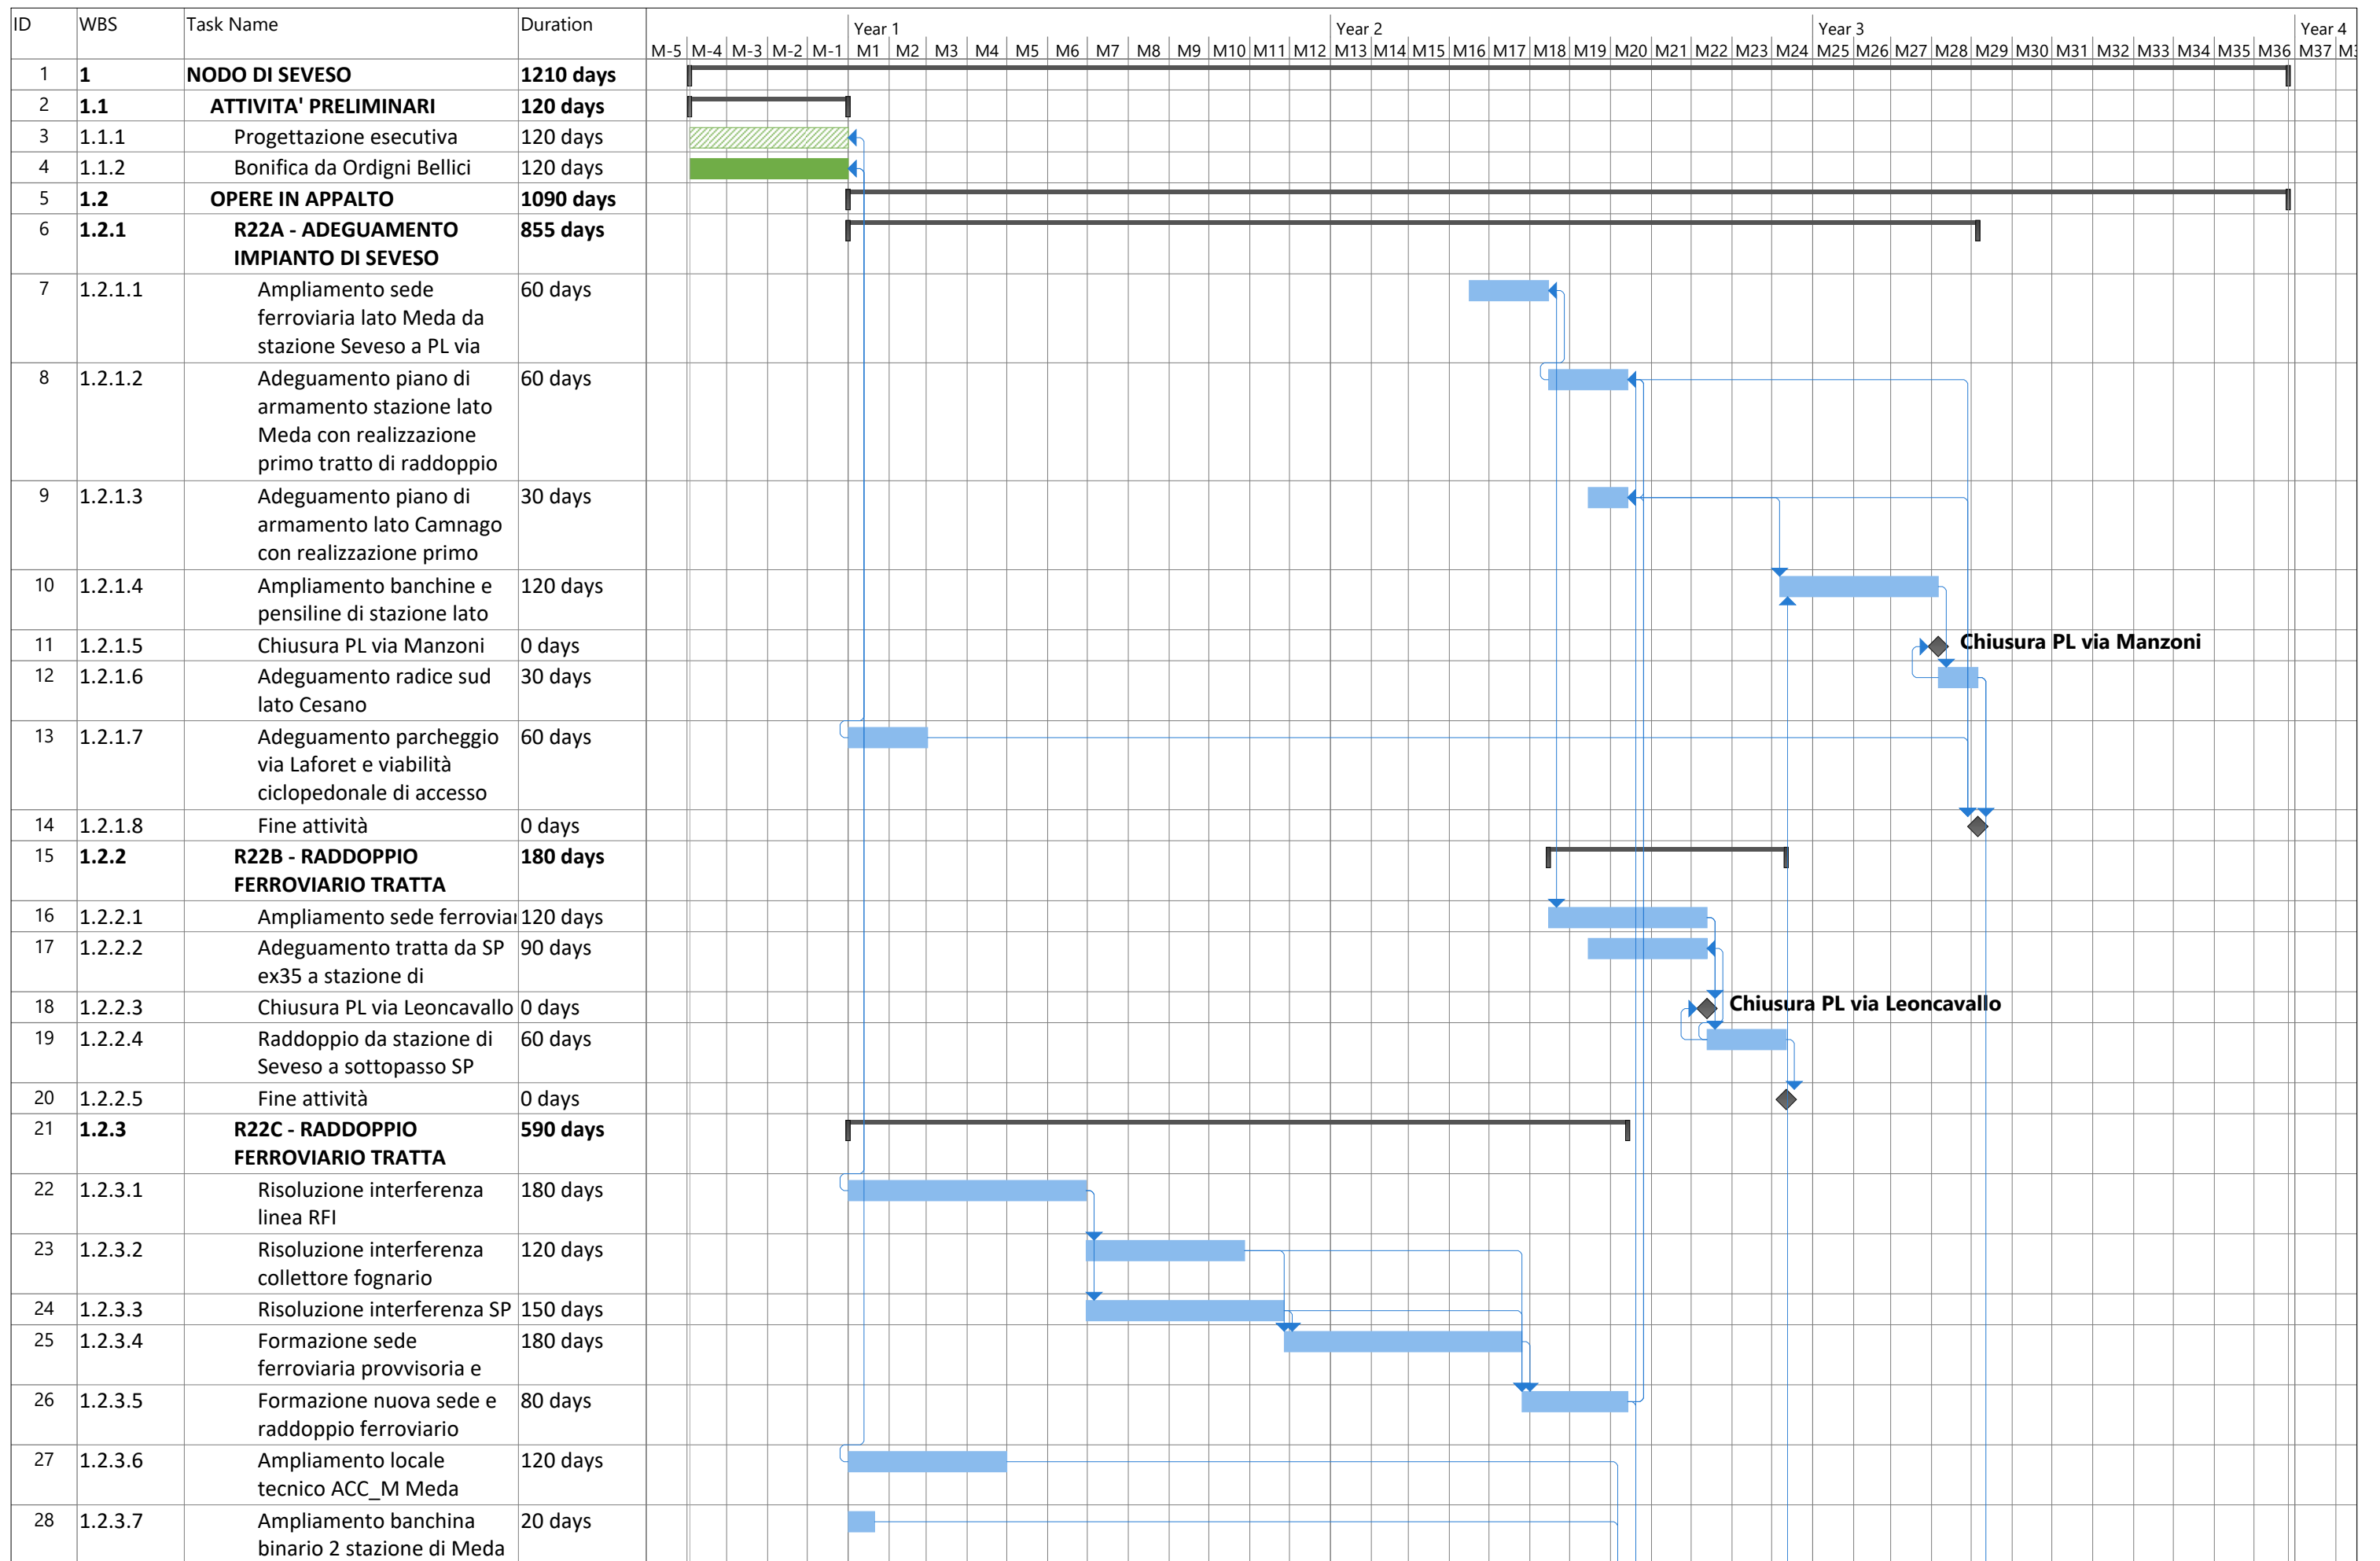

ID	WBS	Task Name	Duration	Year 1					Year 2					Year 3					Year 4																													
				M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	M37	M38		
29	1.2.3.8	Fine attività	0 days																																													
30	1.2.4	OPERE SOSTITUIVE PL	640 days																																													
31	1.2.4.1	R28 - OPERE SOSTITUTIVE PL STAZIONE SEVESO	640 days																																													
32	1.2.4.1.1	SOTTOPASSO VEICOLARE	540 days																																													
33	1.2.4.1.1.1	Formazione viabilità provvisoria per	20 days																																													
34	1.2.4.1.1.2	Realizzazione berlinesi micropali sede ferroviaria e rampa	120 days																																													
35	1.2.4.1.1.3	Posa opere provvisorie di	10 days																																													
36	1.2.4.1.1.4	Scavo di sbancamento a quota di imposta fondazione rampa e	15 days																																													
37	1.2.4.1.1.5	Realizzazione scatolare opera di sottopasso e rimozione opere di	90 days																																													
38	1.2.4.1.1.6	Realizzazione opere di sostegno scavi rampa via Zeuner	60 days																																													
39	1.2.4.1.1.7	Scavo di sbancamento a quota di imposta fondazione rampa	15 days																																													
40	1.2.4.1.1.8	Realizzazione strutture rampe di accesso al sottopasso	120 days																																													
41	1.2.4.1.1.9	Formazione viabilità sottopasso e rampe (opere di drenaggio, riempimenti e	60 days																																													
42	1.2.4.1.1.10	Adeguamento via Sanz	90 days																																													
43	1.2.4.1.1.11	Chiusura PL C.so Montello	0 days																																													
44	1.2.4.1.1.12	Formazione nuova rotatoria P.za Mazzini	20 days																																													
45	1.2.4.1.1.13	Realizzazione nuova viabilità uscita	45 days																																													
46	1.2.4.1.2	PASSERELLA CICLOPEDI	205 days																																													
47	1.2.4.1.2.1	Demolizione recinzioni e strutture	20 days																																													
48	1.2.4.1.2.2	Realizzazione fondazioni nuove strutture e setti in c.a. in elevazione (spalle	45 days																																													
49	1.2.4.1.2.3	Realizzazione struttura di	30 days																																													
50	1.2.4.1.2.4	Varo passerella e realizzazione rampe scale e vani ascensori	50 days																																													

